

Revisión de temas administrativos y financieros

Fernando Félix

III Reunión del Comité Regional SPINCAM.
11-12 de mayo, Vigo, España,



Convenio CPPS-COIUNESCO

- Contrato 4500331813 (24/05/2017) por US \$ 12,000.00
- Contrato 4500338309 (17/08/2017) por US \$271,353.00

Total: US \$283,353.00

- Adicionales (devoluciones)

US \$ 7,143.50

- TOTAL:

US \$290,497.38

Cofinanciamiento SG CPPS

US \$126,000 (30k in cash)



SPINCAM
CHILE-COLOMBIA-ECUADOR-PANAMÁ-PERÚ

Convenios SG CPPS-países

- Tres convenios firmados:
 1. Colombia (INVEMAR) (20 septiembre 2017)
 2. Ecuador (Subsecretaría de Gestión Marino Costera del Ministerio de Ambiente: Convenio de administración de fondos (14 diciembre 2017)
 3. Perú (IMARPE) (30 octubre 2017).
- Chile y Panamá: apoyo a actividades nacionales a través de contrataciones de técnicos de apoyo y pago de servicios para organización de reuniones




SPINCAM
CHILE-COLOMBIA-ECUADOR-PANAMÁ-PERÚ

Balance (ingresos vs gastos)

Ingresos (US \$) 290,497.38

Actividades	Gastos
Actividades regionales	167,177.09
Actividades nacionales	94,278.57
Difusión	12,015.14
Consultoría regional	5,000.00
Suministros	633.53
Administración	12,000.00
TOTAL	291,104.33
Saldo	-606.95

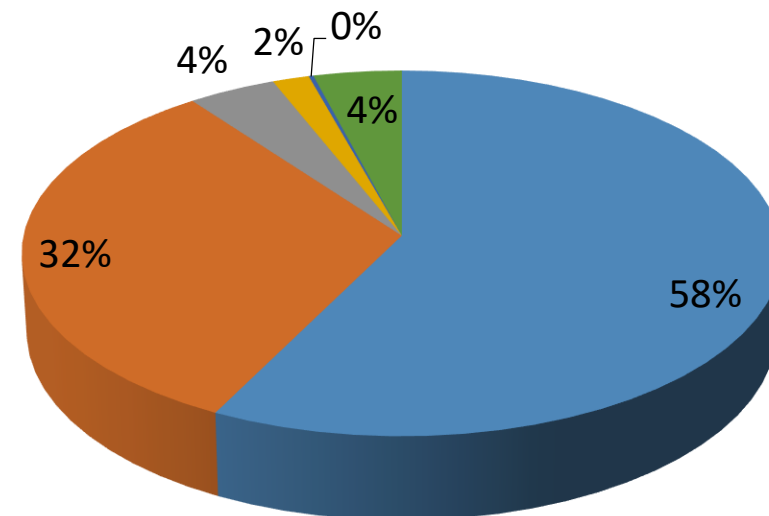

- Actividades regionales
- Actividades nacionales
- Difusión
- Consultoría regional
- Suministros
- Administración



SPINCAM
CHILE-COLOMBIA-ECUADOR-PANAMÁ-PERÚ

Actividades Regionales

Talleres y Cursos 2017

- Reunión de lanzamiento de la Tercera Fase del proyecto SPINCAM y Primera Reunión del Comité Directivo - Ciudad de Panamá - 29-31 de mayo de 2017.
- Evento Internacional de Planificación Espacial Marina (MSP) para una Gestión Sostenible de nuestros Océanos y Mares. 9 de junio de 2017, New York, USA.
- Curso de Cartografía Narrativa y Educación sobre el Océano. 13-15 de septiembre de 2017, Santa Marta, Colombia.
- Taller Regional sobre Clasificación y Tipología de Ecosistemas Marinos y Costeros del Pacífico Sudeste. 13-14 de noviembre de 2017, Guayaquil, Ecuador



Talleres y Cursos 2018

- Reunión técnica sobre ecosistemas costeros y marinos y Taller de Ecosistemas costeros y marinos, uso y presiones. 21 al 23 de marzo de 2018, Guayaquil.
- Segunda Reunión del Comité Directivo de SPINCAM 3. 16 mayo de 2018, Bruselas.
- Taller Regional SPINCAM sobre el Desarrollo de Políticas y Normativa Costeras y Marinas. 15 - 16 junio de 2018, Cali.
- Taller Regional sobre servicios Ecosistemas costeros y marinos. 1 y 2 de octubre, Panamá
- Curso sobre Planificación espacial marina y economía azul sostenible. 3 al 5 de octubre de 2018, Panamá





SPINCAM
CHILE-COLOMBIA-ECUADOR-PANAMÁ-PERÚ

Actividades Regionales

Talleres y Cursos 2019


- Tercera Reunión del Comité Directivo SPINCAM 3. 12-14 de mayo, Vigo, España.
- Foro de Planificación Espacial Marina (MSP) y día Marítimo Europeo. 13 al 17 de mayo, Vigo, España.
- Taller SPINCAM sobre indicadores de crecimiento azul y entrenamiento MSP-Global sobre planificación espacial marina. Junio 2019.



SPINCAM
CHILE-COLOMBIA-ECUADOR-PANAMÁ-PERÚ

Actividades nacionales

	Recibido	Saldo	Total
Chile	9,386.10		9,386.10
Colombia	27,590.00	3,410.00	31,000.00
Ecuador	17,450.58		17,450.58
Panamá	5,441.89		5,441.89
Perú	27,590.00	3,410.00	31,000.00
Total			94,278.57

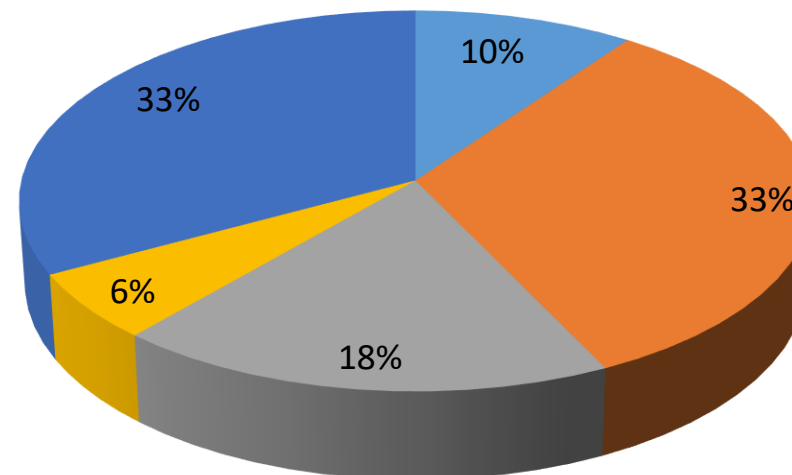

■ Chile ■ Colombia ■ Ecuador
■ Panamá ■ Perú

Desafíos y lecciones aprendidas (i)

- **Firma de convenios para uso del dinero en actividades nacionales**
 - Hay restricciones administrativas en los países para recibir fondos de cooperación internacional.
 - La administración de fondos no debe tener un costo para el proyecto, por tanto no se puede subcontratar un administrador.
 - Solo con 3 países se firmó convenio.
 - Es más difícil para los países sin convenio acceder a los fondos del proyecto porque hay costos asociados a cada envío (para la SG) y demoras porque deben requerirlo a la Secretaría enviando los justificativos.
 - Los países que no firmaron Convenio (Ch y Pa) mostraron el menor nivel de ejecución presupuestal.



SPINCAM
CHILE-COLOMBIA-ECUADOR-PANAMÁ-PERÚ

Desafíos y lecciones aprendidas (ii)

- **Restricciones presupuestarias para contratar personal técnico en las instituciones nacionales**
 - Sobrecarga de trabajo del personal técnico en las instituciones nacionales (administrativas y técnicas).
 - Atraso en la entrega de productos.
 - Productos incompletos, incluyendo diferentes formatos a lo que se ha acordado, causando una sobrecarga innecesaria en la Secretaría
 - Pérdida de capacidad técnica por renuncia o reubicación de funcionarios.



SPINCAM
CHILE-COLOMBIA-ECUADOR-PANAMÁ-PERÚ

Desafíos y lecciones aprendidas (iii)

• Institucionalización de procesos

- Diferentes grados de iniciación en los temas de PEM en los países, los procesos internos para incorporar este tema han sido lentos.
- Actividades SPINCAM no siempre son incluidas en la planificación institucional
 - No todos los países han logrado institucionalizar comités nacionales.
 - Falta de coordinación interinstitucional.
 - Poca participación de técnicos de otras instituciones en talleres y cursos.
 - Dificultades para actualizar indicadores SPINCAM.

Desafíos y lecciones aprendidas (iv)

• Participación en Talleres.

- Demora en la nominación de participantes por requerir permisos para salir del país, en algunos casos lo obtienen 1 o 2 días antes de la actividad.
 - Dificulta la logística
 - Incrementa costos
 - No participación
- Falta de actualización de la lista de técnicos.
 - Se nominan personas que no están debidamente acreditadas.
- Se nombra a las mismas personas.
- Falta transmitir los conocimientos aprendidos en capacitaciones a través de réplicas en sus instituciones.

Desafíos y lecciones aprendidas (v)

• Contratación de técnicos de apoyo (Ec,Ch,Pa)

- Solución temporal ante la necesidad de apoyo técnico de las instituciones nacionales SPINCAM (GIS, legal, logística).
- Ninguno de los cuatro contratados continúa en las instituciones nacionales.
- Capacidad que se pierde.
- En algunos casos por ser externos tuvieron restricciones de acceso a la información.

Desafíos y lecciones aprendidas (i)

• Concepción del Proyecto

- Los entregables están conformados por hitos, productos, metas; lo que produjo confusión en el momento de reportar.
 - identificar bien el alcance de cada uno de ellos y definir con claridad que es lo que se debe reportar.



Muchas gracias
Thank you very much
Dank u wel

Contacto:

nombre@institucion.sp

nombre2@institucion.sp

[**www.atlasspincam.net**](http://www.atlasspincam.net)
